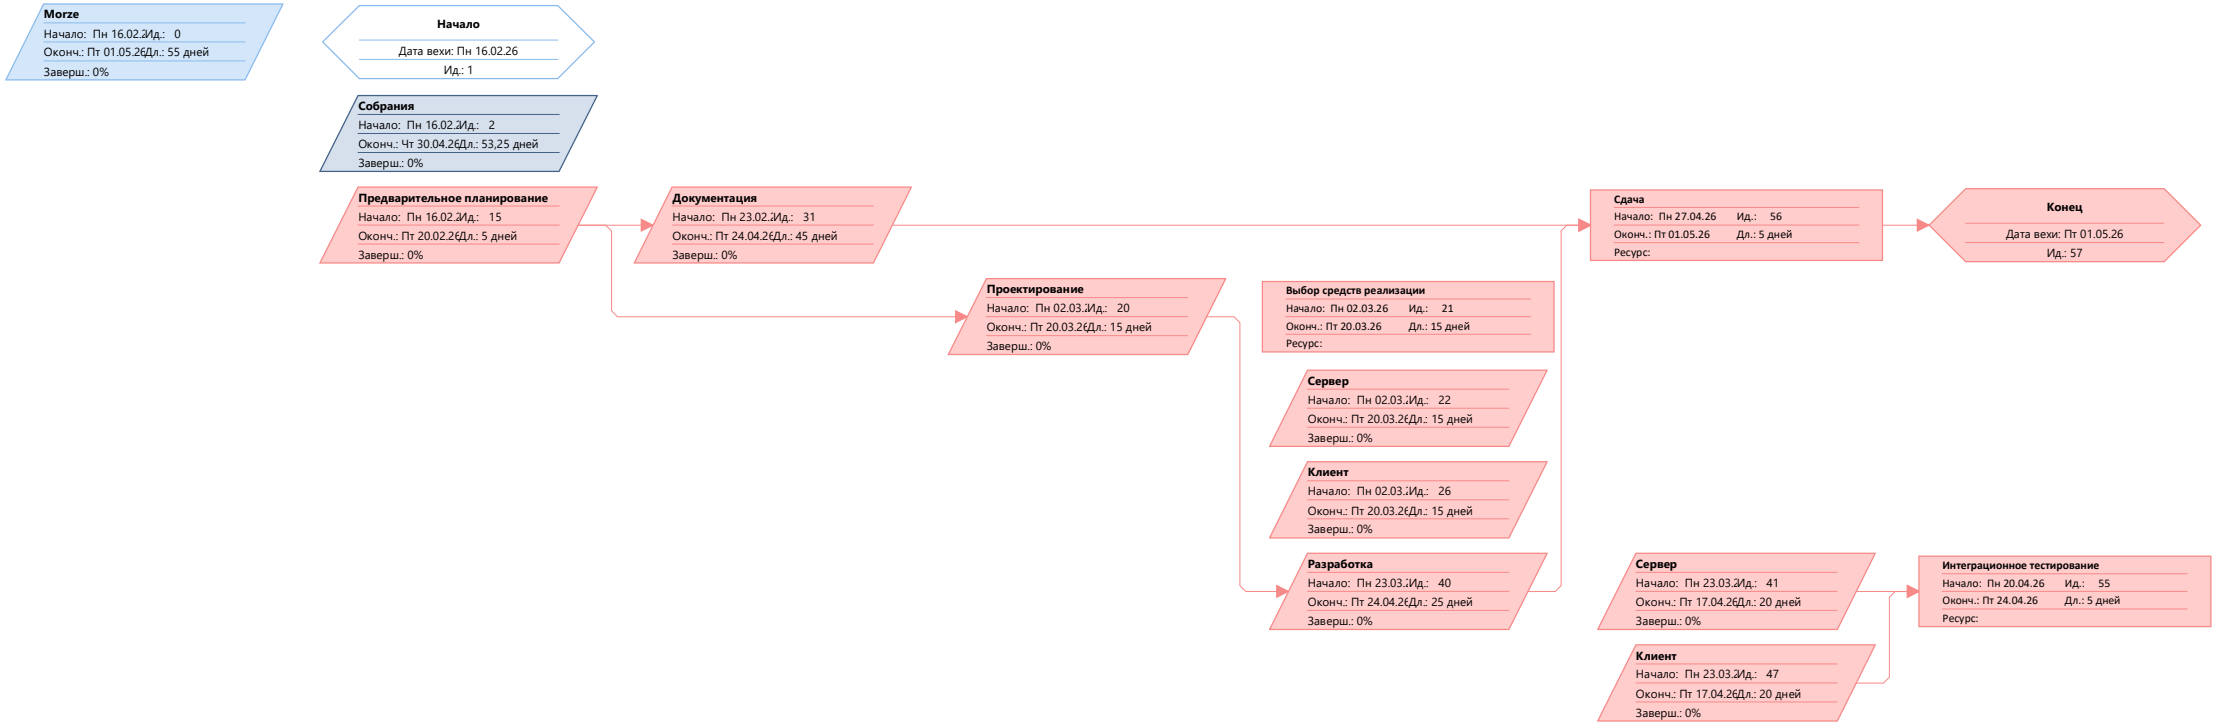
Morze
Начало: Пн 16.02.2 Ид.: 0
Оконч.: Пт 01.05.26 Дл.: 55 дней
Заверш.: 0%
Начало
Дата вехи: Пн 16.02.26
Ид.: 1
Собрания
Начало: Пн 16.02.2 Ид.: 2
Оконч.: Чт 30.04.26 Дл.: 53,25 дней
Заверш.: 0%
Предварительное планирование
Начало: Пн 16.02.2 Ид.: 15
Оконч.: Пт 20.02.26 Дл.: 5 дней
Заверш.: 0%
Документация
Начало: Пн 23.02.2 Ид.: 31
Оконч.: Пт 24.04.26 Дл.: 45 дней
Заверш.: 0%
Сдача
Начало: Пн 27.04.26 Ид.: 56
Оконч.: Пт 01.05.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Конец
Дата вехи: Пт 01.05.26
Ид.: 57
Проектирование
Начало: Пн 02.03.2 Ид.: 20
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Выбор средств реализации
Начало: Пн 02.03.26 Ид.: 21
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 15 дней
Ресурс:
Сервер
Начало: Пн 02.03.2 Ид.: 22
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Клиент
Начало: Пн 02.03.2 Ид.: 26
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Разработка
Начало: Пн 23.03.2 Ид.: 40
Оконч.: Пт 24.04.26 Дл.: 25 дней
Заверш.: 0%
Сервер
Начало: Пн 23.03.2 Ид.: 41
Оконч.: Пт 17.04.26 Дл.: 20 дней
Заверш.: 0%
Клиент
Начало: Пн 23.03.2 Ид.: 47
Оконч.: Пт 17.04.26 Дл.: 20 дней
Заверш.: 0%
Интеграционное тестирование
Начало: Пн 20.04.26 Ид.: 55
Оконч.: Пт 24.04.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
